

## Dokumentace průběhu prací

**Projekt :** Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

**Objednatel :** SVJ Korunní 810

**Zhotovitel :** AZ Profil

**Období :** 11.6. – 22.6. 2019

**Vyhotovil :** Ptáček

Dokončení  
prací a  
demontáž  
lešení  
(sekce H)



Dokončení  
pokládky  
dlažby -  
spárování  
(sekce H1)



Tmelení spár  
PU tmelem,  
oprava  
stávající  
finální omítky  
(sekce H1)



Návoz  
ocelové  
konstrukce  
zábradlí  
s novou  
povrchovou  
úpravou  
(sekce H1)



Tmelení spár  
PU tmelem,  
akryl pod  
lemovacím  
plechem,  
očištění  
povrchu  
parapetních  
plechů,  
malba spodní  
betonové  
konstrukce  
(sekce H1)



Osazování  
vodících lišt  
žaluzií, nátěr  
parapetních  
plechů  
(sekce H1)



Montáž  
ocelové  
konstrukce  
zábradlí  
(sekce H1)



Bourání  
souvrvství  
balkónů,  
demontáž  
parapetních  
plechů,  
očištění  
nosné  
konstrukce  
(sekce J)




Foto před opravou - degradace tepelné izolace parapetů, stavební odpad pod izolací, špatně ukončená parotěsná izolace (sekce J)



Penetrace a pokládka první vrstvy hydroizolační stěrky (sekce J)



Oprava  
parotěsné  
izolace,  
vyčištění  
prostoru pod  
parapety,  
vlození nové  
tepelné  
izolace  
(sekce J)

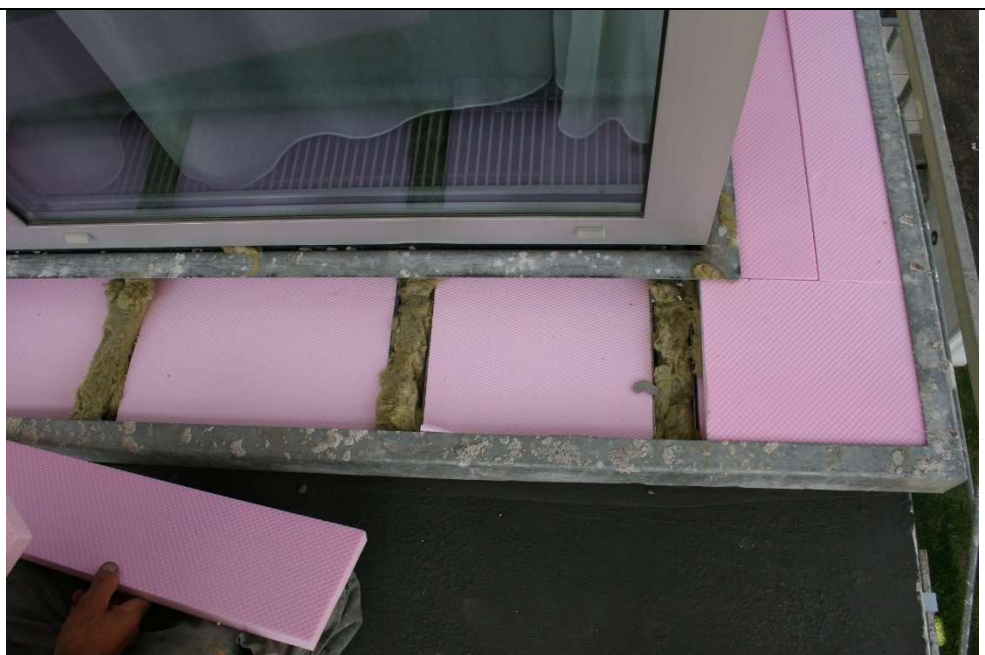

Instalace  
dočasného  
kamerového  
systému do  
prostoru  
staveniště

