

Dokumentace průběhu prací



Projekt : Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 23.6. – 10.7. 2019


Vyhotovil : Ptáček

| | |
|--|--|
| <p>Montáž skleněných výplní – dočišťování skel – viz. Samostatný protokol vad a nedodělků (sekce H1)</p> |  |
| <p>Montáž lemovacích plechů s druhou vrstvou hydroizolace (sekce J)</p> |  |


Demontáž
parapetů
(viditelný
odpad a suť
na tepelné
izolaci),
oprava
povrchu
betonu po
vybourání
skladby
(sekce Ka)



Dokončování
detailů,
čištění dlažby
a fasády
(sekce H1)

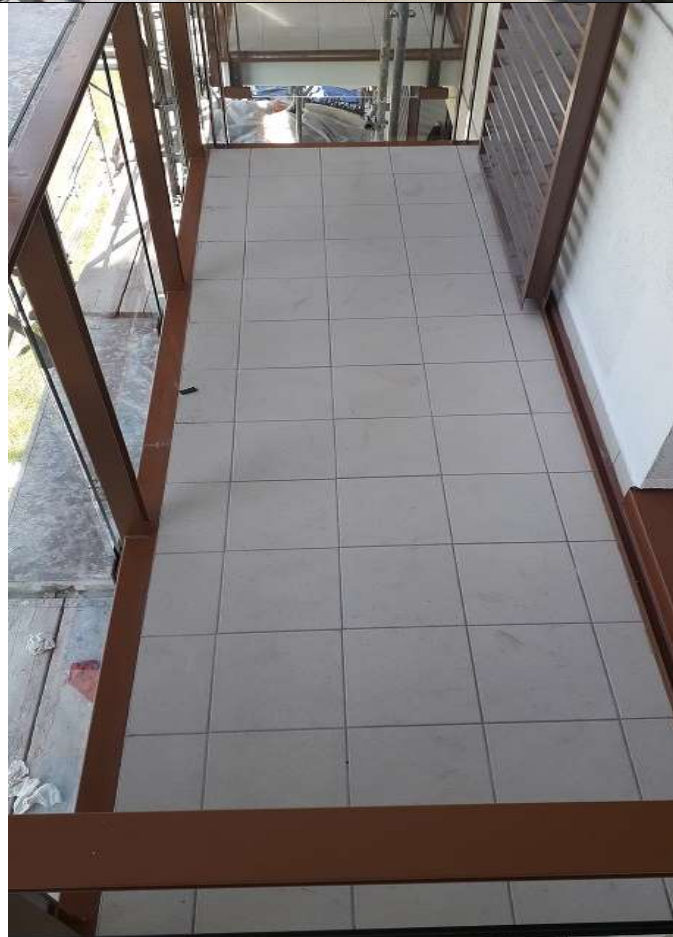


Nátěr
parapetních
plechů,
oprava
fasády,
tmelení spojů
a osazení
vodící lišty
žaluzií(sekce
J)

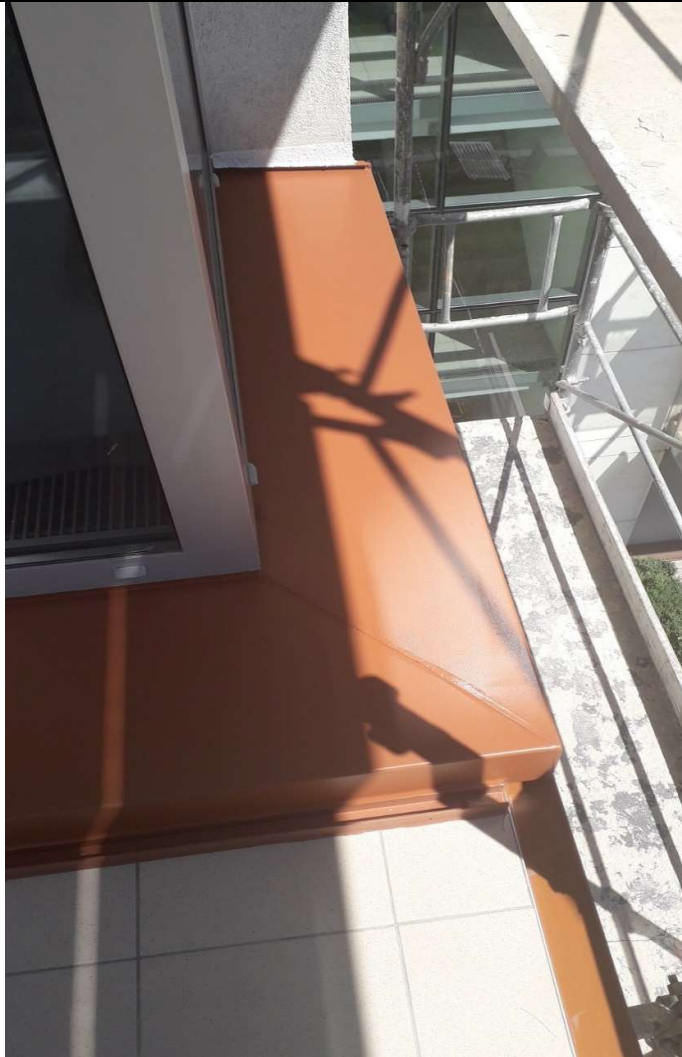

Zpětná
montáž lamel
a čištění
teras 1.NP
po demontáži
lešení
(sekce H1)



Demontáž
lešení po
odstranění
závad (viz.
samostat.
protokol)
(sekce H1)

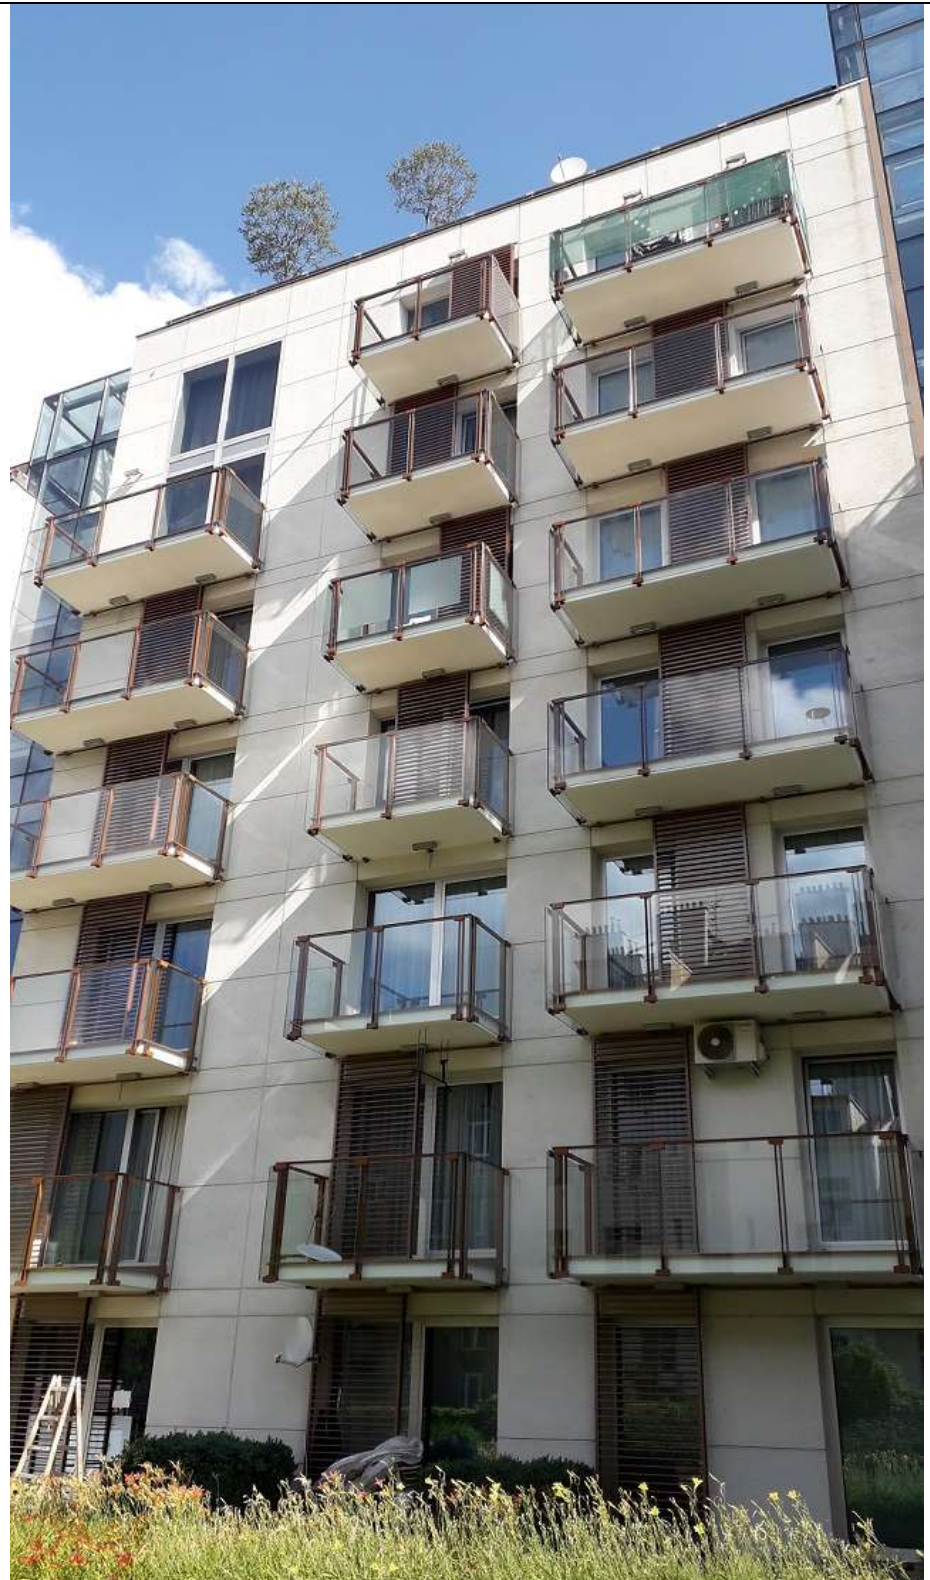

Montáž
lešení
(sekce J1)



| | |
|---|--|
| <p>Kompletace zábradlí, čištění povrchů a dokončování detailů (sekce J)</p> |  |
| <p>Dočišťování skel (sekce J)</p> |  |
| <p>Výmalba stropů balkonů, akrylátové tmelení lemovací lišty (sekce Ka)</p> |  |

Pokládka
dlažby a
zpět. Montáž
parapetů,
před finální
úpravou
(sekce Ka)

