

Dokumentace průběhu prací

Projekt :

Oprava vjezdu a výjezdu do podzemních garáží Rezidence Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 22.7. – 5.8. 2019

Vyhotovil : Ptáček


Původní stav
: Praskliny a
nesoudržné
plochy
pojezdových
částí,
oprýskaný
nátěr
ukončení
obrubníků,
zašlá malba
stěn
s prasklinami
v omítce



Původní stav
: Napojení na
odvodňovací
kanál
vypraskaný,
bez jakékoliv
povrchové
úpravy. Z čel
betonových
zdí odpadává
omítka



Celoplošné
broušení
povrchů,
mechanické
odstranění
nesoudržných
vrstev

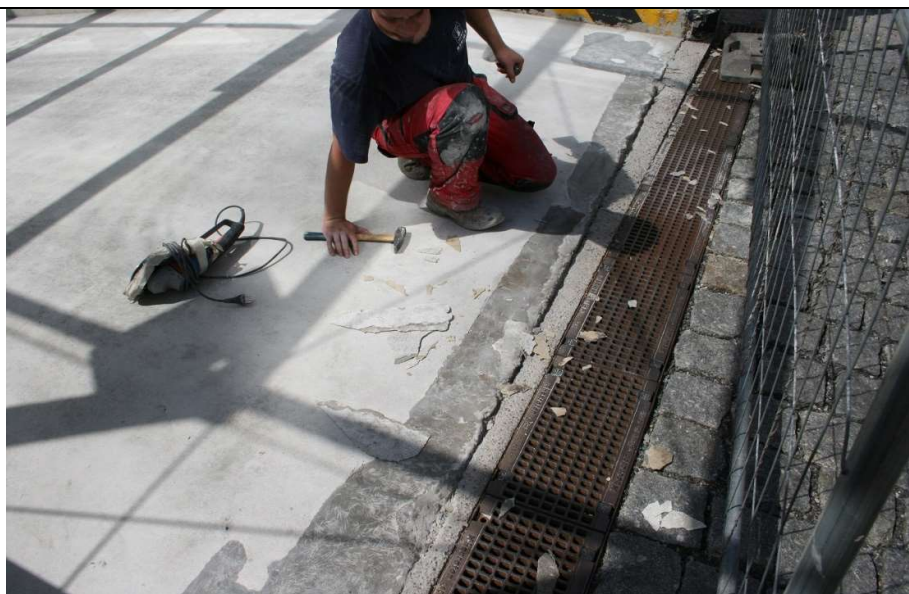

Lokální
opravy
hlubokých
poškození žb
kontruce +
první vrstva
epoxidové
penetrace se
vsypem



Zalítí
napojení na
odvodňovací
kanál
epoxidovou
pryskyřicí
s křemičitým
pískem



Aplikace
první vrstvy
epoxidové
penetrace



Povrch po zaschnutí, před druhou vrstvou epoxidu	
Druhá, nosná vrstva epoxidové pryskyřice	
Lokální opravy dutých míst před finálovou vrstvou (viz. zápis v SD)	

Třetí, finálová vrstva nátěru v barvě RAL dle výběru	
Finální vrstva s napojením na dilataci a odvodňovací žlábek v podzemním podlaží	
Umytí stěn vysokotlakým vodním čističem, penetrace povrchu, oprava prasklin a první vrstva malby	

Oprava
 omítek
 čelních ploch
 stěn vjezdu a
 výjezdu,
 oprava
 prasklin v
 ploše



Druhá vrstva
 malby



Finálové vyčištění plochy a odvodňovacích kanálků v obou úrovních. Obnovení provozu	
Po celou dobu uzavření ramp zajištěno dočasné dopravní značení (cca 30 kusů) s třícestnými semaforů dle zpracování projektu DIO (Dopravně inženýrské opatření)	
Uzavření garážových ramp využito pro přeložení (úprava nájezdových úhlů) žulové dlažby vjezdu a výjezdu z areálu směrem do ulice Korunní – foto výjezd	

Foto vjezd
Úprava
nájezdových
úhlů a
obnovení
žlutého
nátěru
vodorovného
dopravního
značení

